

POROČILO O DELOVANJU NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO

ZA MESEC JULIJ 2025




NEK je v juliju proizvedla 534013 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 505827,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,2 % večja, od načrtovane (500000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Diagram obratovanja NEK za mesec julij 2025

Proizvedena energija na generatorju: 534012,97 MWh
Proizvedena energija na pragu: 505827,54 MWh

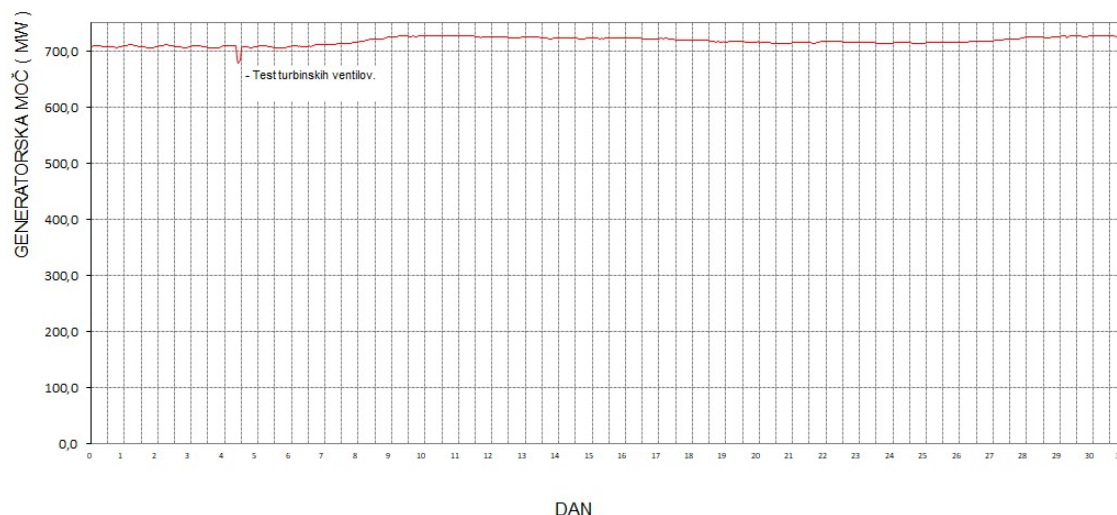

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,4 °C in največ za 3 °C od dovoljenih 3 °C.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 11,1 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 29,5 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,0003 % (letne omejitve), do konca julija pa 0,0051 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 µSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,06 % letne omejitve oziroma do konca julija 0,72 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 1,7 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.
