

IZVJEŠĆE O RADU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO ZA OŽUJAK 2018.




NEK je u ožujku 2018. proizveo 542673 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 516728 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,32 % iznad planirane (510000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

Dijagram rada NEK za ožujak 2018.

Proizvedena energija na generatoru: 542672,95 MWh
Proizvedena energija na pragu: 516728,07 MWh

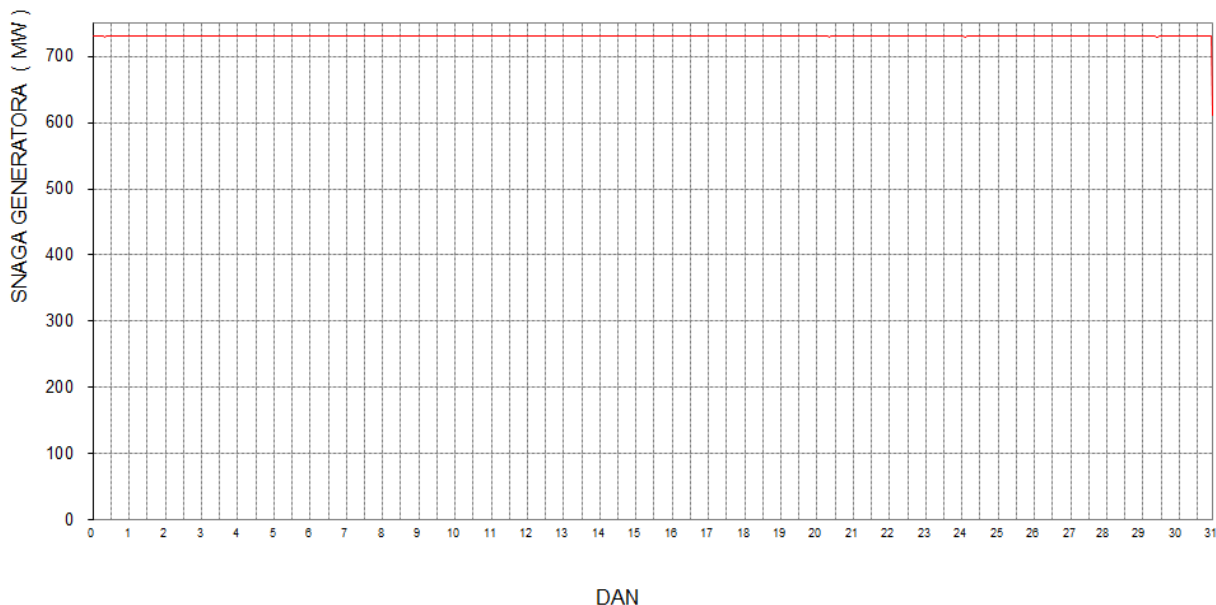

U ožujku se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,3 °C, a najviše za 2,8 °C od dozvoljena 3 °C.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u ožujku iznosio 9,02 %, a ukupni godišnji udio do kraja ožujka 18,47 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00159 %, a godišnje 0,0033 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 µSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u ožujku iznosio je 0,08 % i 0,24 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 0,869 m³ nisko i srednje radioaktivnog otpada.
