

## POROČILO O DELOVANJU NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO ZA MESEC JANUAR 2017




NEK je v januarju proizvedla 544057,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 514159,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,8 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Diagram obratovanja NEK za mesec januar 2017

Proizvedena energija na generatorju: 544 057,31 MWh  
Proizvedena energija na pragu: 514159,43 MWh

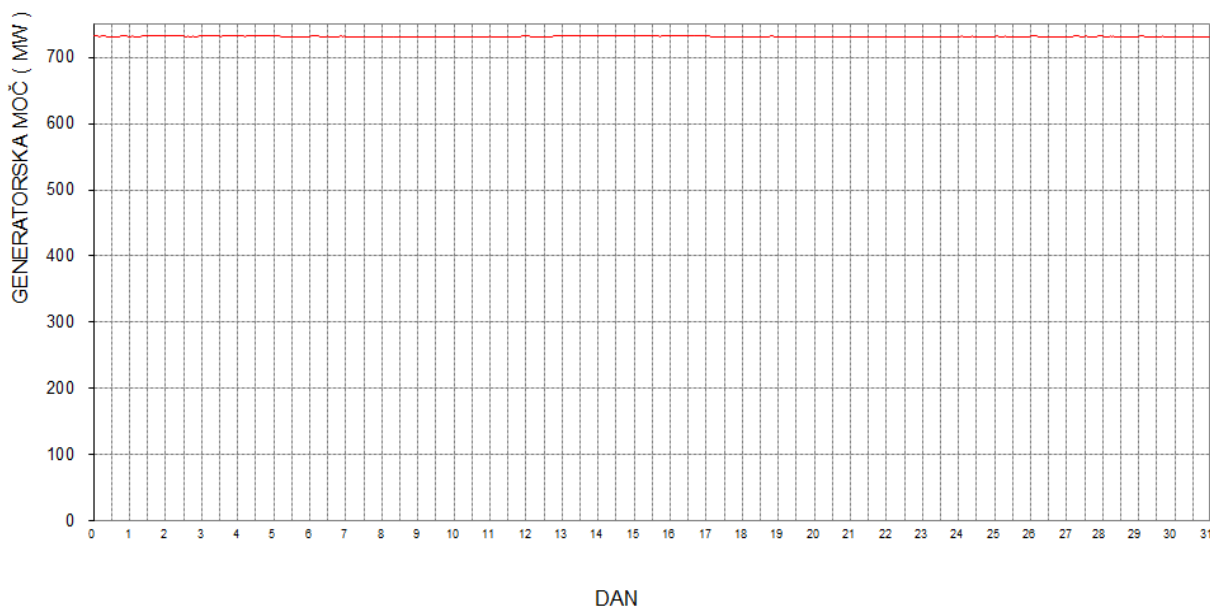

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 2,9 °C in največ za 3 °C od dovoljenih 3 °C.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju znašal 0,18 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju znašal 0,00019 letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 µSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju je znašal 0,12 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 13 paketov (2,704 m<sup>3</sup>) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.
